




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

MÊS: MAIO
ANO: 2021

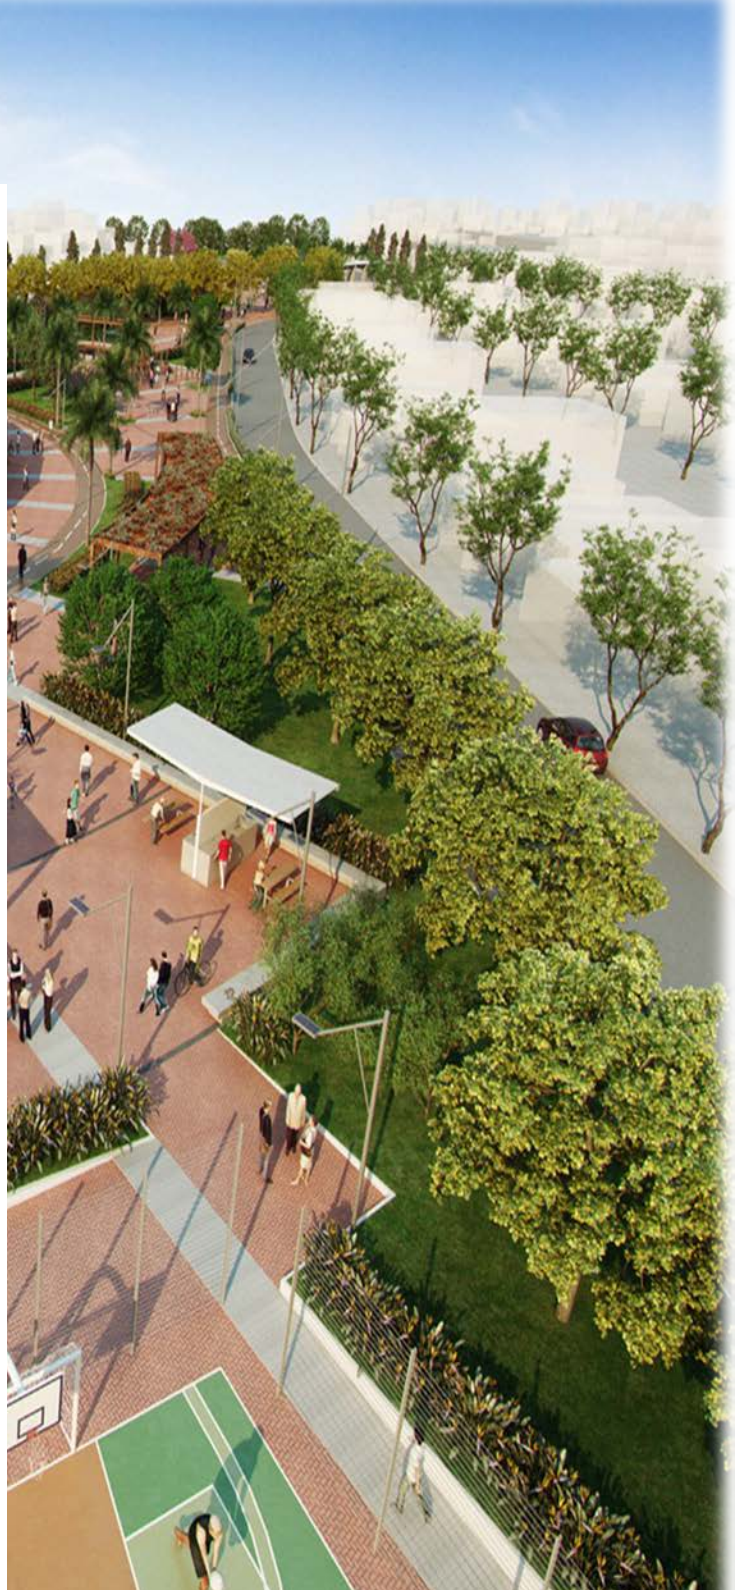

Execução de obras

Objeto da obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAZENDA

Nome do contratado: L. R. VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ do contratado: 14.407.626/0001-21

Local da Execução da obra: COMUNIDADE FAZENDA

Origem do Recurso: SEDUC/PA

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: nº 002/2018-PMC

Data reinício da obra: 07/08/2018

Data final da obra: 30/06/2021

Valor total da obra: R\$ 702.515,22

Valor total aplicado: R\$ 351.415,87

Valor a desembolsar: R\$ 351.099,35

Percentual aplicado: 50,02%

Valor aplicado no mês vigente: 0,00

Execução de obras

Objeto da obra: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES.

Nome do contratado: L. R. Vidal Construtora Eireli - EPP

CNPJ do contratado: 14.407.626/0001-21

Local da Execução da obra: . RUA DO ROSÁRIO, ENTRE TV. CARNEIRO DE MENDONÇA E TV. TRANSPRAIANA

Origem do Recurso: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS.

Modalidade da licitação contratada: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 001/2017

Data início da obra: 25/06/2018

Data final da obra: 01/10/2021

Valor total da: R\$ 539.469,21

Valor total aplicado: R\$ 535.835,40

Valor a desembolsar: R\$ 3.633,81

Percentual aplicado: 99,33%

Valor aplicado no mês vigente: 0,00
